Underlag för snöröjning · skapat 20 sep 2026

Snöröjning 2026/27

Exempelfastigheten 1 och Exempelfastigheten 2 · Brf Exempelgården, Exempelstad

Svara senast	Avtalsform	Period
20 okt 2026	**Säsongsavtal**	**1 nov 2026–15 apr 2027**

Servicenivå

Startdjup	5 cm snö
Klart före	kl. 07:00
Helger	Ingår
Halkbekämpning	Sand
Kommunens plogvall	Tas bort vid infarten

Ytor

	Exempelfastigheten 1	Exempelfastigheten 2	**Totalt**
Maskinyta	1 528 m²	720 m²	**2 248 m²**
Handyta	156 m²	112 m²	**268 m²**
Snöupplag	112 m²	80 m²	**192 m²**
Entréer	4	2	**6**
Hinder	2	1	**3**
Smalaste passage	2,8 m	–	**2,8 m**

Övrigt till firmorna

Gästparkeringen behöver inte vara klar före kl. 07:00.

Snö får inte läggas mot lekplatsen vid hus B.

Kontakt


Namn	Kontaktperson i styrelsen
Organisation	Brf Exempelgården
Telefon	070-000 00 00
E-post	styrelsen@exempel.invalid

Till firman. Svara senast 20 okt 2026 och ange om priset är inklusive eller exklusive moms. Har du fått förfrågan via Uteplan svarar du via länken i mejlet, annars direkt till kontaktpersonen ovan.

Exempelfastigheten 1

Exempelgatan 12, 123 45 Exempelstad · bostadsrättsförening

Fastighet 1 av 2

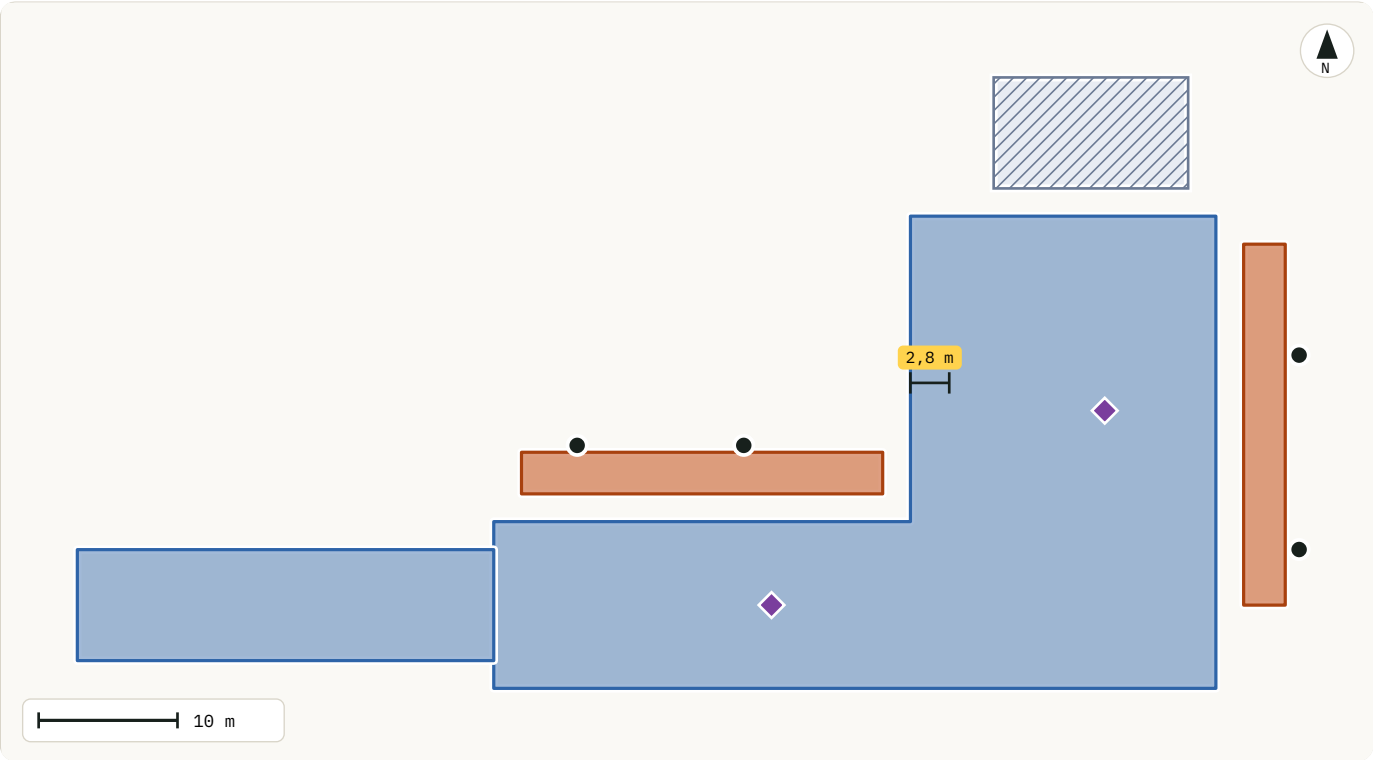

Maskinyta · Handyta · Snöupplag · Entré · Hinder · Smalaste passage

Mått

Maskinyta	1 528 m²	Asfalt 1 288 m² · grus 240 m²
Handyta	156 m²	Plattor/marksten 156 m²
Snöupplag	112 m²	
Entréer	4	
Hinder	2	Brunnslock, stolpe
Smalaste passage	2,8 m	Infarten från gatan


Praktiskt

Portkod	0000
Hund	Nej
Parkerade bilar	Bilar står längs gaveln vid hus A mellan kl. 17 och 07.
Prioritera	Entrén mot gården ska vara klar först (tillgänglighet).
Gångbana	Ingen

Exempelfastigheten 2

Exempelgatan 14, 123 45 Exempelstad · bostadsrättsförening

Fastighet 2 av 2

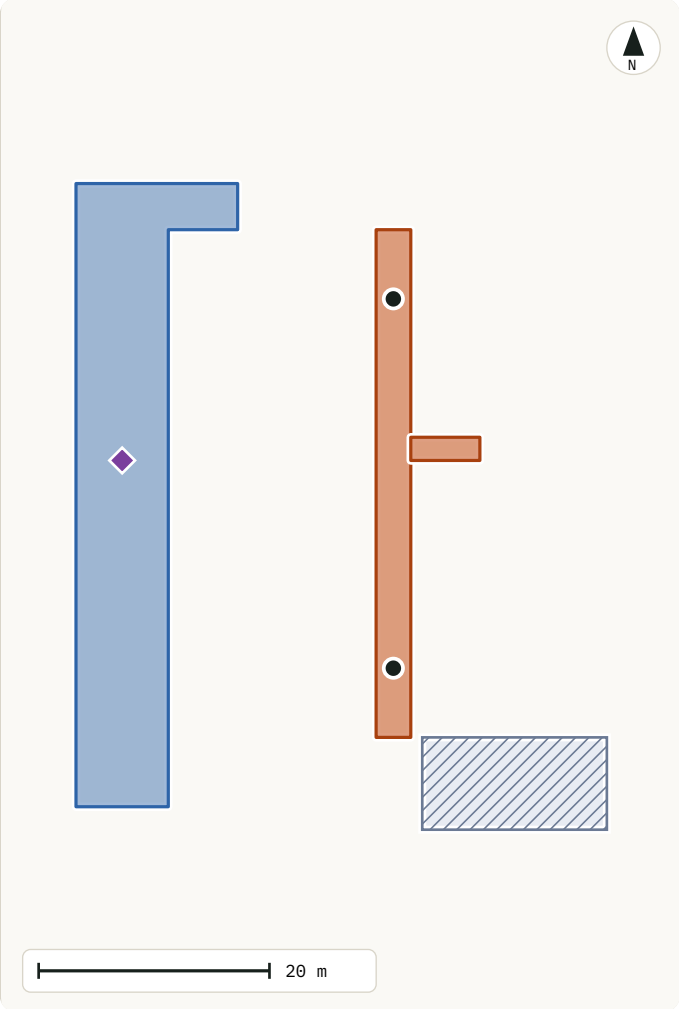

Maskinyta Handyta Snöupplag Entré Hinder

Mått

Maskinyta	720 m²	Asfalt 720 m²
Handyta	112 m²	Betong 112 m²
Snöupplag	80 m²	
Entréer	2	
Hinder	1	Kantsten
Smalaste passage	Inte angiven	

Praktiskt

Portkod	Ingen
Hund	Ja
Parkerade bilar	Inget särskilt
Prioritera	Inget särskilt
Gångbana	Ingen
